Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 2026–2027

Alcaldía Municipal de El Rosal – Cundinamarca · Oct 3, 2026 ·

CONTROL DEL DOCUMENTO

Este PETI fija la ruta de TI de la Alcaldía de El Rosal para 2026–2027, con proyección a 2030, y se construyó con la Guía MGGTI.GE.ES.03 de MinTIC (v3.0, noviembre 2023) y su plantilla (Anexo 2).

Campo	Detalle
Entidad	Alcaldía Municipal de El Rosal – Cundinamarca · NIT 899.999.151-4 · Código SIGEP 390
Documento	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 2026–2027
Versión	02 (actualiza el PETI 2026 aprobado el 21/01/2026)
Vigencia	2026–2027 (periodo del Plan de Desarrollo Municipal), proyección 2030
Elaboró	Luis Sandoval Fuentes e Iván Bermúdez – Contratistas TIC
Revisó	Luzaira Henao Neira – jefe de Prensa y TIC (RSI, Res. 001/2026)
Aval	Bibiana González Rojas – secretaria general y de Gobierno
Aprueba	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (acta pendiente) · Jorge Mikan Salgado – alcalde
Clasificación	Público (Ley 1712 de 2014)

Versión	*Fecha*	*Cambio*
01	*21/01/2026*	*PETI 2026 aprobado*
02	*Octubre 2026*	*Reestructuración con la guía MGGTI v3.0 e integración de diagnósticos MSPI, MAE/MGGTI/MGPTI, C&TI, IPv6, FURAG 2025 e inventario TIC*

Pendiente antes de aprobar: número del acta del Comité y validación de misión, visión y mapa de procesos institucionales con la Secretaría de Planeación (sección 5).

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

1. INTRODUCCIÓN

El Rosal obtuvo 78,04 en el Índice de Gobierno Digital 2025 (FURAG), pero su habilitador de Arquitectura cayó a 21,67 y Servicios y Procesos Inteligentes quedó en 12,5. Este PETI se enfoca en cerrar

esas dos brechas sin perder lo ganado en seguridad, cultura y gobernanza.

El Decreto 767 de 2022 establece la Política de Gobierno Digital y su habilitador de Arquitectura, del que el PETI es instrumento central. El Decreto 612 de 2018 obliga a integrar el PETI, el Plan de Tratamiento de Riesgos y el Plan de Seguridad y Privacidad al plan de acción institucional y publicarlos en la web.

El documento resume la situación actual de TI, la arquitectura objetivo, las brechas, el portafolio de proyectos con su hoja de ruta y los indicadores de seguimiento. Se articula con el Plan de Desarrollo Municipal “El Rosal Necesita el Cambio” (Acuerdo 03 de 2024) y con la estrategia de Ciudad y Territorio Inteligente (C&TI) 2026–2030.

Beneficios esperados para la entidad:

- Un portafolio de proyectos de TI priorizado y financiable con presupuesto propio, SGP y convocatorias MinTIC.
- Capacidades internas de TI formalizadas: gobierno, proyectos, arquitectura y seguridad.
- Información oportuna y de calidad para decisiones del despacho y las secretarías.
- Trámites y servicios digitales que reduzcan desplazamientos de la ciudadanía rural y urbana.
- Infraestructura segura, actualizada y preparada para IPv6 y servicios en la nube.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

2. OBJETIVO Y ALCANCE

2.1 Objetivo general

Definir la estrategia de Tecnologías de la Información de la Alcaldía de El Rosal para 2026–2027, con un portafolio priorizado de proyectos, una hoja de ruta y metas medibles que apoyen el Plan de Desarrollo Municipal y la transformación digital del territorio.

2.2 Objetivos específicos

1. Diagnosticar la gestión de TI en los siete dominios del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI).
2. Definir misión, visión, objetivos estratégicos y capacidades de TI alineados con el PDM y la visión C&TI 2030.
3. Identificar las brechas entre la situación actual y la deseada.
4. Consolidar y priorizar las iniciativas de TI en una hoja de ruta con costos, responsables y plazos.
5. Establecer indicadores para medir la ejecución y el impacto del PETI.
6. Definir la estrategia de aprobación, publicación y socialización del PETI.

2.3 Alcance

El PETI aplica a todas las dependencias, sedes y servicios de la Alcaldía: sede principal, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Salud, Comisaría de Familia, Inspección, SISBÉN, centros de San Nicolás, Centro Universitario, Centro Sensorial y Estación de Policía conectada. Cubre las cuatro fases de la guía (Planear, Analizar, Construir, Socializar) y los dominios Estrategia, Gobierno, Información, Sistemas de Información, Infraestructura, Uso y Apropiación y Seguridad.

No incluye el detalle técnico de cada proyecto ni los instrumentos completos que lo soportan; estos se relacionan como anexos en la sección 12.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

3. MARCO NORMATIVO

Las normas siguientes generan obligaciones directas para la gestión de TI del municipio; la Oficina Jurídica debe validar su vigencia en cada actualización anual.

Norma	Descripción y obligación para El Rosal
Constitución Política, arts. 15, 20, 74 y 209	Habeas data, acceso a la información y principios de la función administrativa
Ley 136 de 1994 y Ley 1551 de 2012	Organización y funcionamiento de los municipios
Ley 1341 de 2009, modificada por Ley 1978 de 2019	Principios del sector TIC y prioridad al acceso y uso de las TIC
Ley 1273 de 2009	Delitos informáticos y protección de la información
Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013	Protección de datos personales: responsable del tratamiento, registro de bases de datos ante la SIC, derechos de titulares
Ley 1712 de 2014	Transparencia y acceso a la información pública; publicación de datos abiertos
Ley 594 de 2000	Ley General de Archivos; gestión documental física y electrónica
Decreto-Ley 019 de 2012 y Ley 2052 de 2020	Racionalización de trámites; trámites nuevos digitales y uso de SUIT
Decreto 088 de 2022	Reglamenta la Ley 2052 de 2020: digitalización y automatización de trámites
Ley 1955 de 2019, art. 147	Transformación digital pública y proyectos de Ciudades y Territorios Inteligentes
Ley 2294 de 2023	Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026
Ley 2108 de 2021	Internet como servicio público esencial y universal
Decreto 1078 de 2015	Decreto Único Reglamentario del sector TIC
Decreto 767 de 2022	Política de Gobierno Digital: habilitadores, líneas de acción y PETI
Decreto 1083 de 2015 y Decreto 1499 de 2017	Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
Decreto 612 de 2018	Integración de PETI, PTR y PSPI al plan de acción institucional y publicación web
Decreto 415 de 2016	Fortalecimiento institucional en TIC: rol y ubicación del líder de TI
Decreto 620 de 2020	Servicios Ciudadanos Digitales: interoperabilidad, autenticación y carpeta ciudadana
Decreto 1389 de 2022	Gobernanza de la infraestructura de datos del Estado
Resolución MinTIC 500 de 2021	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI
Resolución MinTIC 1519 de 2020	Estándares de publicación, accesibilidad web y datos abiertos
Resoluciones MinTIC 2710 de 2017 y 1126 de 2021; Circular 015 de 2022	Adopción de IPv6 en coexistencia con IPv4
CONPES 3995 de 2020	Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital
CONPES 3975 de 2019	Política de Transformación Digital e Inteligencia Artificial
Directiva Presidencial 03 de 2021	Lineamientos para nube, inteligencia artificial, seguridad digital y gestión de datos
Directiva Presidencial 02 de 2022	Directrices sobre seguridad digital en la administración pública

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

Acuerdo Municipal 03 de 2024	Plan de Desarrollo Municipal “El Rosal Necesita el Cambio”
Resolución 001 de 2026	Designación del Responsable de Seguridad Digital (RSI) y del Delegado de Protección de Datos
Resolución 002 de 2026	Designación del Responsable C&TI y constitución del Comité Municipal C&TI

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

4. METODOLOGÍA

El PETI se construyó con las cuatro fases y 17 actividades de la Guía MGGTI.GE.ES.03 y el Anexo 1 (Herramientas para la construcción del PETI), usando como insumo los diagnósticos que la entidad produjo entre enero y septiembre de 2026.

Fase	Actividades de la guía	Producto en este PETI
1. Planear	1. Equipo y stakeholders · 2. Presupuesto · 3. Cronograma	Equipo PETI (tabla 4.1), matriz de interesados (sección 11)
2. Analizar	4. Entorno organizacional · 5. Planes externos · 6. Diagnóstico de TI · 7. Tendencias	Secciones 5 y 6
3. Construir	8. Estrategia de TI · 9. Mejoras en servicios · 10. Mejoras por dominio · 11. Brechas · 12. Otros planes de Gobierno Digital · 13. Hoja de ruta · 14. Indicadores · 15. Consolidación	Secciones 7 a 10
4. Socializar	16. Aprobación y publicación · 17. Socialización	Sección 11

4.1 Equipo de construcción del PETI

Rol en el PETI	Persona	Cargo
Patrocinador	Jorge Mikan Salgado	Alcalde Municipal
Revisión y aval	Bibiana González Rojas	Secretaria General y de Gobierno
Líder estratégico de TI	Luzaira Henao Neira	Jefe de Prensa y TIC · RSI · Responsable C&TI
Equipo técnico	Luis Sandoval Fuentes	Contratista TIC · Delegado de Protección de Datos
Equipo técnico	Iván Bermúdez	Contratista TIC
Alineación con PDM	Por designar	Secretaría de Planeación
Presupuesto	Por designar	Secretaría de Hacienda
Seguimiento	Por designar	Control Interno

4.2 Fuentes utilizadas

- Resultados FURAG del Índice de Gobierno Digital 2022–2025.
- Diagnóstico MSPI 2026 (GA-F-001), Matriz de Riesgos (GA-MR-001), Plan de Tratamiento de Riesgos, Informe de Vulnerabilidades y procedimientos de incidentes y parches.
- Informes de brechas MAE, MGGTI y MGPTI; procesos de AE, hoja de ruta AE, priorización de proyectos, plan de comunicaciones, lecciones aprendidas y estrategia de uso y apropiación (MAE-01 a MAE-10).
- Diagnóstico de madurez C&TI (MMMCTIC), visión y objetivos 2030, marco estratégico, política, manual de gobernanza, matriz RACI, hoja de ruta y plan de acción C&TI 2026–2027.
- Diagnóstico IPv6 Fase 1 (2026) e inventario de equipos GA-F-033.
- Consolidado gerencial del Despacho 2026.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

- PETI de referencia: Alcaldía de Facatativá 2024–2027, Alcaldía de Cota 2020–2023, Colombia Compra Eficiente 2026 y Minciencias 2023–2026.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

5. CONTEXTO Y MODELO OPERATIVO DE LA ENTIDAD

El Rosal es un municipio de categoría 6 de Sabana Occidente, creado en 1997 y ubicado a unos 25 minutos de Bogotá (MinVivienda); su desempeño institucional es 67,68/100 (puesto 47 nacional, DNP 2024) y su madurez C&TI 1,70/5.

5.1 Motivadores estratégicos

Motivador	Fuente	Implicación para TI
Estrategia nacional	PND 2022–2026 (Ley 2294 de 2023); ODS 9, 11 y 16; CONPES 3995 y 3975	Conectividad, transformación digital pública, seguridad digital, datos e IA
Lineamientos y políticas	Política de Gobierno Digital (Decreto 767 de 2022); MIPG; Servicios Ciudadanos Digitales	Mejorar habilitadores con bajo puntaje FURAG: Arquitectura y Servicios y Procesos Inteligentes
Estrategia departamental	Plan de Desarrollo “Gobernando: Más que un Plan” (Ordenanza 001 de 2024) (Gobernación)	Visión 2040 de innovación social y tecnológica; cofinanciación de proyectos
Estrategia territorial	PDM “El Rosal Necesita el Cambio” (Acuerdo 03 de 2024)	Seguridad con videovigilancia, salud, educación, vías y acueductos veredales con apoyo de TI
Estrategia institucional	Visión C&TI 2030, Política C&TI CI-POL-001, PSPI y PTR 2026	Seis ejes C&TI; meta MMMCTIC de 1,70 a 2,50 en 2026 y 3,0 en 2027
Compromisos de cumplimiento	IPv6 (plazo vencido 31/12/2022), Ley 1581, SUIT al 100 %, ITA	Cerrar rezagos normativos con riesgo de sanción

5.2 Contexto institucional

Misión (propuesta a validar con Planeación): Prestar los servicios públicos a cargo del municipio, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, conforme a la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012.

Visión territorial 2030 (adoptada en el documento CI-VIS-001): El Rosal, “Jardín de la Sabana Inteligente”, será un territorio reconocido por su gobernanza digital transparente, servicios accesibles desde cualquier lugar, infraestructura segura y conectada, innovación e inclusión digital de todos sus habitantes.

Abierto: transcribir aquí la misión y la visión oficiales de la Alcaldía y las líneas estratégicas del Acuerdo 03 de 2024.

Cifras de gestión 2026 (Consolidado del Despacho, cifras preliminares a validar con Hacienda):

Secretaría	Presupuesto (millones COP)	Ejecución	Avance metas
Obras e Infraestructura	11.100	75 %	63 %
Hacienda (funcionamiento y deuda)	7.380	81 %	81 %

Desarrollo Social	3.170	79 %	67 %
Desarrollo Económico y Agro	1.490	46 %	55 %
Gobierno y Seguridad	950	53 %	53 %
Planeación	241	57 %	58 %
Total municipio	24.331	74,7 %	62,8 %

El consolidado se alimenta copiando cifras a mano de seis archivos; automatizarlo es una de las oportunidades de analítica de este PETI.

5.3 Estructura organizacional

La Alcaldía opera con Despacho, Secretarías General y de Gobierno, Hacienda, Planeación y Ordenamiento, Obras e Infraestructura, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Agro, y Salud; además Comisaría de Familia, Inspección de Policía, SISBÉN, Control Interno, Prensa y TIC, Atención al Usuario, Almacén y Archivo.

La gestión de TI depende de la Jefatura de Prensa y TIC, no de una oficina de TI con reporte directo al Alcalde como orienta el Decreto 415 de 2016. Abierto: número de servidores de planta y contratistas por dependencia y organigrama vigente.

5.4 Modelo operativo

El mapa de procesos MIPG existe pero requiere actualización y no está articulado con los sistemas de información (brecha AI-02). La tabla usa la estructura de referencia de una alcaldía de categoría 6 y debe ajustarse al mapa vigente.

Tipo	Procesos
Estratégicos	Direccionamiento estratégico · Planeación institucional y territorial · Comunicaciones · Gestión de TIC (por formalizar)
Misionales	Desarrollo social y poblacional · Salud pública · Desarrollo económico y agropecuario · Infraestructura y obras · Ordenamiento territorial y licencias · Gobierno, seguridad y convivencia · Gestión tributaria
Apoyo	Talento humano · Gestión financiera · Contratación · Jurídica · Gestión documental · Recursos físicos y almacén · Atención al ciudadano y PQRSD
Evaluación y control	Control interno · Mejoramiento continuo

5.5 Alineación de TI con los procesos

Solo la gestión financiera tiene un sistema propio; los demás procesos dependen de plataformas nacionales, ofimática y carpetas compartidas.

Proceso	Sistema que lo soporta	Cubrimiento	Oportunidad de mejora con TI

Gestión financiera y contable	HAS (Access) sobre servidor FISCALHACIENDA, Windows Server 2012; CHIP	Parcial	Migrar a plataforma soportada, integrar con tributario y documental
Gestión tributaria	Módulo tributario (por identificar) y SQL Server 2017	Parcial	Liquidación y pago en línea de predial e ICA
Contratación	SECOP II	Total	Tablero de seguimiento contractual
Talento humano	SIGEP II; nómina por identificar	Parcial	Expediente laboral digital
Gestión documental	Servidor de archivos (SVRARCHIVOS); sin sistema de gestión documental electrónico	Sin cobertura	Sistema de gestión de documento electrónico con TRD y ventanilla única
Atención al ciudadano y PQRSD	Correo, portal web y SUIT	Parcial	Ventanilla digital con radicación y trazabilidad
Desarrollo social (SISBÉN)	Aplicativo SISBÉN IV (DNP)	Total	Cruce de datos sociales para focalización
Gobierno y seguridad	Videovigilancia (DVR Hikvision, 34 JAC en curso)	Parcial	Centro de monitoreo municipal
Planeación y proyectos	SUIFP Territorio, Gesproy-SGR, Excel	Parcial	Banco de proyectos y tablero de metas del PDM
Control interno	FURAG y Excel	Parcial	Seguimiento automatizado de planes

5.6 Trámites, servicios y OPA

La entidad tiene más de 40 trámites caracterizados en SUIT, con cerca del 60 % actualizado; ninguno es totalmente en línea y la atención llega por correo, web y ventanilla presencial.

Trámite u OPA prioritario (a validar en SUIT)	Dependencia	Canal actual	Oportunidad con TI
Impuesto predial unificado	Hacienda	Presencial, recibo físico	Liquidación y pago en línea 7x24
Industria y comercio (ICA)	Hacienda	Presencial y correo	Declaración y pago electrónico

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525


Licencias urbanísticas	Planeación	Presencial	Radicación digital y seguimiento de estado
Certificado de residencia	Gobierno	Presencial	Expedición automática con firma digital
Paz y salvo y certificados	Hacienda	Presencial	Descarga en línea con código de verificación
PQRSD	Todas	Correo y ventanilla	Formulario único con trazabilidad y notificación

La meta 2026 es SUIT al 100 % y tres trámites de mayor demanda totalmente en línea; el detalle va en el Anexo 4C (caracterización de trámites).

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La gestión de TI está en nivel Inicial: MGGTI 39,5 % (30/76), MAE 26,7 % (15,5/58), MGPTI 31,5 % (14,5/46), MSPI 1,65/5 y C&TI 1,70/5. El FURAG 2025 es alto (78,04) porque mide cumplimiento declarado; los diagnósticos internos muestran capacidades aún informales.

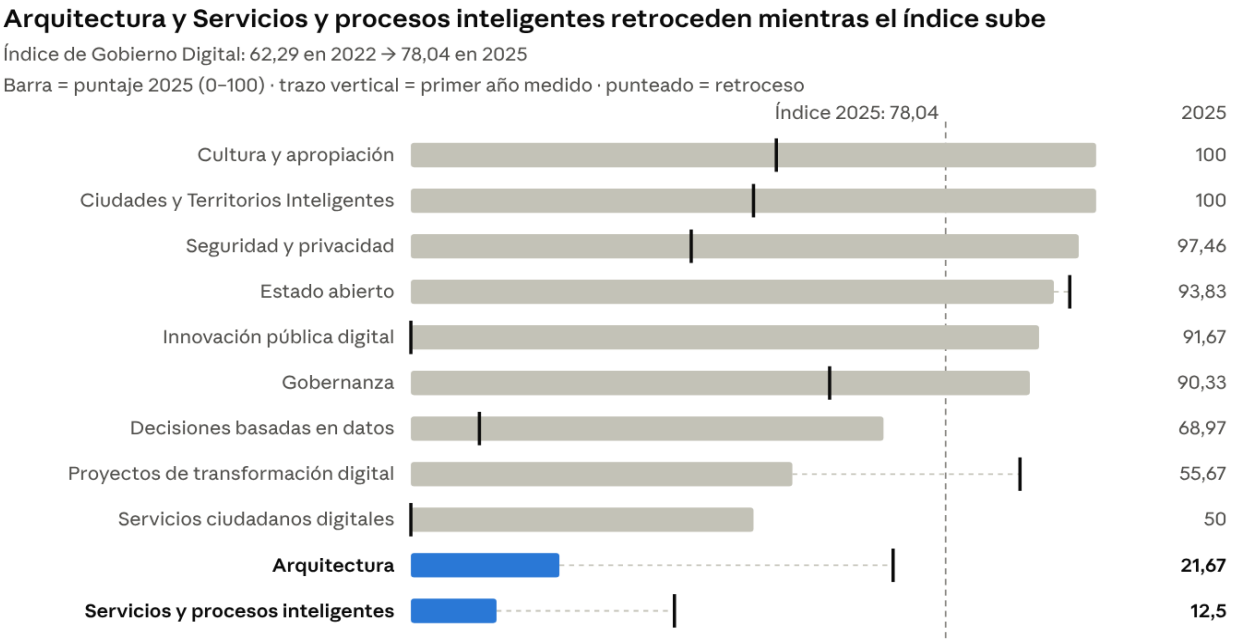

FURAG – Índice de Gobierno Digital, Alcaldía de El Rosal, resultados 2022–2025 (archivo gobierno_digital_el_Rosal.xlsx)

El índice subió 15,7 puntos en tres años, pero Arquitectura perdió 48,7 puntos desde 2022 y Servicios y procesos inteligentes quedó en 12,5: son los dos habilitadores que este PETI prioriza.

Instrumento 2026	Resultado	Nivel	Dominio más fuerte	Dominio más débil
MGGTI (76 criterios)	39,5 %	Inicial / En desarrollo	Seguridad 70 %	Gestión de información 29,2 %
MAE (58 criterios)	26,7 %	Inicial	Arquitectura de seguridad 44 %	Uso y apropiación de AE 17 %
MGPTI (46 criterios)	31,5 %	Inicial	Contexto estratégico 40 %	Cierre de proyectos 25 %
MSPI (18 criterios, 0–5)	1,65	Inicial	Gobernanza e incidentes 2,33	Datos personales 0,67
MMMCTIC (38 criterios, 1–5)	1,70	En proceso / Inicial	Infraestructura 2,5	Economía, movilidad y ambiente 1,0

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

6.1 Estrategia de TI

El PETI 2026 existe y está alineado con el PDM, pero no tiene portafolio formal, catálogo de servicios ni tablero de indicadores (MGGTI Estrategia 45,8 %).

- **Misión y visión de TI:** no existen declaraciones propias de TI; la orientación viene de la misión y visión C&TI 2030.
- **Servicios de TI:** sin catálogo ni acuerdos de nivel de servicio. El soporte llega por soportetic@elrosal.gov.co, extensión TIC o en persona, sin herramienta de tickets.
- **Indicadores:** no hay tablero de TI; el seguimiento lo hace Control Interno sobre actividades del PETI.

Servicios de TI que se prestan hoy (a formalizar en catálogo):

ID	Servicio	Usuario	Situación
ST-01	Acceso a internet cableado y WiFi	Funcionarios y contratistas	Operativo, APs domésticos sin control centralizado
ST-02	Correo institucional @elrosal.gov.co	Funcionarios y contratistas	Operativo con proveedor externo, sin DMARC/DKIM verificado
ST-03	Soporte a usuarios y equipos	Funcionarios y contratistas	Informal, sin registro ni ANS
ST-04	Gestión de equipos de cómputo	Funcionarios y contratistas	Inventario GA-F-033, mantenimiento por demanda
ST-05	Almacenamiento de archivos compartidos	Dependencias	Servidor SVRARCHIVOS, respaldo parcial
ST-06	Portal web institucional	Ciudadanía	Hosting externo, actualización de accesibilidad en curso
ST-07	Antivirus	Entidad	Instalado en equipos, sin consola central verificada
ST-08	Copias de seguridad	Sistemas críticos	Solo servidores, sin pruebas de restauración
ST-09	Videovigilancia	Secretaría de Gobierno	DVR en sede principal; ampliación a 34 JAC
ST-10	Capacitación en TIC	Funcionarios y ciudadanía	Talleres sin plan formal

Capacidades de TI actuales:

Categoría	Capacidad	¿La tiene?
Estrategia	Gestionar arquitectura empresarial	No (proceso definido en 2026, sin ejecutar)
Estrategia	Gestionar proyectos de TI	Parcial, sin metodología
Estrategia	Definir políticas de TI	Sí (seguridad, uso de TIC, C&TI)
Gobierno	Gestionar procesos de TI	No
Gobierno	Gestionar riesgos de TI	Sí (matriz 2026)
Información	Administrar modelos de datos	No
Información	Gestionar flujos de información y datos abiertos	Parcial
Sistemas de información	Definir arquitectura de sistemas	No

Sistemas de información	Administrar sistemas de información	Parcial, dependiente de proveedores
Sistemas de información	Interoperar	No
Infraestructura	Gestionar disponibilidad y monitoreo	No
Infraestructura	Soporte a usuarios	Parcial
Infraestructura	Gestionar cambios	No
Infraestructura	Administrar infraestructura	Parcial
Uso y apropiación	Apropiar TI	Parcial
Seguridad	Gestionar seguridad de la información	Sí, en desarrollo

6.2 Gobierno de TI

No existe macroproceso ni esquema documentado de gobierno de TI (MGGTI Gobierno 35,7 %); las decisiones se toman en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y, desde 2026, en el Comité Municipal C&TI.

Instancias de decisión. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño supervisa MIPG y seguridad, sin reglas de operación ni actas periódicas de TI. La Resolución 002 de 2026 creó el Comité Municipal C&TI; su primera sesión con acta está pendiente.

Riesgos de TI. La matriz GA-MR-001 (MAGERIT v3 / ISO 27005, enero 2026) tiene 15 riesgos: 6 críticos, 8 altos y 1 medio en nivel inherente. Los de mayor valor (20/25) son ausencia de delegado de datos personales (R-02), incumplimiento del esquema de madurez en seguridad (R-03) y ransomware por falta de firewall (R-04).

Presupuesto de TI. No hay rubro de TI identificado en el presupuesto; las inversiones se registran en el Plan Anual de Adquisiciones sin línea base por proyecto. El plan de acción C&TI estima $55–100 millones para 2026 de varias fuentes. Abierto: presupuesto de TI ejecutado en 2025.

Políticas vigentes:

Política	Estado
Seguridad y privacidad de la información (GA-F-002)	Aprobada enero 2026, falta socialización masiva
Uso aceptable de TIC (contraseñas, USB, software licenciado, correo)	Definida en el Anexo 3 del PSPI
Ciudad y Territorio Inteligente (CI-POL-001)	Aprobada y publicada 2026
Tratamiento de datos personales	Básica, sin registro de bases ante SIC
Continuidad de la operación	Plan en fortalecimiento, sin RTO/RPO
Gestión y gobierno de datos	No existe
Nube y adquisición tecnológica	No existen

Estructura y talento humano de TI. Tres personas cubren todos los roles: la Jefe de Prensa y TIC (líder TI, RSI, Responsable C&TI y arquitecta empresarial) y dos contratistas. La concentración de roles y la dependencia de contratos anuales son el principal riesgo de continuidad.

Rol	Persona	Dedicación a TI
Líder TI, RSI, Responsable C&TI	Luzaira Henao Neira	Compartida con Prensa
Soporte, sistemas, datos, protección de datos	Iván Bermúdez (contratista)	Completa
Infraestructura y redes	Luis Sandoval Fuentes (contratista)	Completa

Existe matriz RACI para C&TI (CI-RACI-001) con 40 actividades; falta una RACI de los procesos de gestión de TI.

Gestión de proyectos. No hay metodología, actas de inicio y cierre, informes de avance ni lecciones aprendidas (MGPTI 31,5 %). El seguimiento es verbal y en Excel.

6.3 Gestión de información

La información está fragmentada por sistema, sin responsables de datos ni interoperabilidad: es el dominio más débil (MGGTI 29,2 %, MAE Información 25 %), aunque el FURAG 2025 da 68,97 a Decisiones basadas en datos.

Componente	Situación actual
Gobierno de información	No existe esquema ni responsables por dominio de datos
Arquitectura de información	Sin modelo de datos institucional; cada sistema tiene el suyo
Inventario de activos de datos	Parcial (equipos y cuentas de correo); faltan bases financieras, tributarias, sociales y con datos personales
Calidad y metadatos	Sin estrategia de calidad ni catálogo de metadatos
Datos abiertos	Plan de Datos Abiertos desactualizado; sección de transparencia activa en la web
Interoperabilidad	Ninguna: SUIT, SECOP, CHIP y los sistemas internos operan aislados
Analítica	Reportes manuales en Excel; el consolidado del Despacho se arma copiando cifras
Información geográfica	Sin sistema de información geográfica para POT, licencias o predial
Gestión documental electrónica	Sin sistema; documentos en servidor de archivos y equipos personales

Entidades de información clave identificadas: contribuyente, predio, impuesto y recaudo (Hacienda); licencia y uso del suelo (Planeación); beneficiario y hogar SISBÉN (Desarrollo Social); contrato y proveedor (Contratación); funcionario (Talento Humano); PQRSD (todas); obra y meta del PDM (Planeación y Obras); evento de seguridad (Gobierno).

6.4 Sistemas de información

El portafolio es pequeño y depende de proveedores: un sistema financiero sobre plataforma sin soporte, plataformas nacionales y ningún sistema misional propio (MGGTI Sistemas 35 %).

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

Sistema	Función	Tipo	Plataforma	Debilidad
HAS – Software administrativo contable y financiero	Presupuesto, contabilidad, tesorería	Comercial, instalado en sitio	Access sobre Windows Server 2012 Foundation (servidor FISCALHACIENDA)	Sistema operativo sin soporte desde octubre de 2023; sin integración
Bases de datos institucionales	Datos de Hacienda y otros módulos	Motor comercial	SQL Server 2017 sobre Windows Server 2019 (servidor HP ML350 Gen10)	Sin documentación ni pruebas de restauración
Archivos compartidos	Documentos de dependencias	Servicio de archivos	Windows Server 2019 (SVRARCHIVOS, HP DL160 Gen9)	Sin TRD ni control de versiones
Portal web institucional	Información, transparencia, trámites	Hosting externo	elrosal-cundinamarca.gov.co	Sin registro AAAA (IPv6); accesibilidad en ajuste
Correo institucional	Comunicación oficial	Servicio en la nube	@elrosal.gov.co	Proveedor y controles anti-suplantación por verificar
Plataformas nacionales	Contratación, empleo, trámites, contabilidad pública, SISBÉN, proyectos	Software como servicio	SECOP II, SIGEP II, SUIT, CHIP, SISBÉN IV, SUIFP y Gesproy	Cargue manual y doble digitación
Videovigilancia	Seguridad ciudadana	Comercial	DVR Hikvision DS-7216HUHI-K2	Sin centro de monitoreo

Abierto: nombre y proveedor del módulo tributario y de nómina, y licenciamiento de HAS. El detalle de fichas técnicas va en el Anexo de catálogo de sistemas.

Actividad del ciclo de vida, mantenimiento y soporte	Madurez	Hallazgo
Levantamiento de necesidades	Informal	Llega por correo o verbal, sin formato
Análisis de requisitos	Informal	Términos de referencia básicos en contratos
Diseño de la solución	No tiene	No hay arquitectura de referencia
Codificación	No aplica	No hay desarrollo propio
Pruebas	Informal	Aceptación sin criterios de calidad
Despliegue en producción	Informal	Lo hace el proveedor sin control de cambios
Mantenimiento correctivo y adaptativo	Informal	Por demanda al proveedor, sin plan de reversión
Mantenimiento evolutivo	No tiene	Sin hoja de ruta de sistemas
Soporte nivel 1 y 2	Informal	Dos contratistas, sin tickets ni ANS
Soporte nivel 3	Informal	Proveedores sin ANS en contratos

Ningún sistema tiene gestión de obsolescencia (brecha ASI-05); el sistema financiero HAS sobre Windows Server 2012 es el caso más urgente porque concentra la información presupuestal y contable del municipio.

6.5 Infraestructura de TI

La infraestructura funciona pero es obsoleta e insegura: 61 de 84 equipos usan Windows 10, 7 u 8, sistemas ya sin soporte del fabricante, no hay firewall perimetral y la red se apoya en equipos domésticos no gestionables.

Equipos de usuario y servidores (inventario GA-F-033, 2026):

Indicador	Valor
Registros en inventario	84: 47 escritorio, 19 todo en uno, 16 portátiles, 2 servidores
Estado	72 funcionan, 8 no funcionan, 3 nuevos, 1 desmantelado
Windows 10 (soporte finalizado el 14/10/2025)	52 equipos
Windows 7 y 8/8.1 (sin soporte)	9 equipos
Windows 11	20 equipos
Equipos con 4 GB de RAM o menos	38
Registros con Windows u Office sin licencia	18
Equipos marcados como lentos u obsoletos	12
Dependencias con más equipos	Salud 12, Desarrollo Social 11, Hacienda 9, Comisaría 9

El inventario registra contraseñas de equipos en una columna; deben retirarse del archivo de inmediato y gestionarse en un gestor de credenciales.

Servidor	Hardware	Sistema operativo	Uso
SERVIDOR	HP ProLiant ML350 Gen10, 32 GB, 7 TB	Windows Server 2019	SQL Server 2017, servicios de Gobierno
SVRARCHIVOS	HP ProLiant DL160 Gen9	Windows Server 2019	Archivos compartidos
FISCALHACIENDA	HP ProLiant ML310e Gen8	Windows Server 2012 Foundation (sin soporte)	Sistema financiero HAS

Red y comunicaciones (diagnóstico IPv6 Fase 1): proveedor de internet Inter&OS; router Cisco ISR 4321 y Cisco RV042G en el cuarto técnico; un switch gestionable (HPE OfficeConnect 1620) y seis switches de borde mayormente no gestionables; enlace MikroTik RB750 con la Gobernación; siete routers Tenda N301 en sedes y seis puntos WiFi TP-Link y D-Link de gama doméstica. No hay firewall dedicado, VLAN, controladora WiFi ni diagrama de red.

Servicios de infraestructura actuales:

ID	Servicio	Estado
ST.SI.01	Nube	Solo portal web y correo con terceros; sin estrategia de nube
ST.SI.02	Redes LAN, WLAN y WAN	Operativas, sin segmentación ni gestión central
ST.SI.03	Seguridad perimetral	Inexistente: solo antivirus y reglas básicas del router
ST.SI.04	Servidores	Tres servidores físicos sin virtualización; uno sin soporte
ST.SI.05	Almacenamiento y respaldo	Discos locales; sin esquema 3-2-1

ST.SI.06	Telefonía	Por inventariar
ST.SI.07	Centro de cómputo	Cuarto técnico en sede principal con UPS básicas y llave física, sin registro de acceso
ST.SI.08	Periféricos	Nueve impresoras de red HP y Ricoh, varias sin tóner

Operación y mantenimiento	Sí	No	Observación
Monitoreo de infraestructura		X	Fallas se conocen cuando el usuario reporta
Gestión de capacidad		X	Servidor de Gobierno requiere disco adicional
Disposición de residuos tecnológicos		X	Sin procedimiento documentado
Acuerdos de nivel de servicio		X	Ni internos ni con proveedores
Mesa de servicio	Parcial		Correo soportetic@elrosal.gov.co sin tickets
Planes de mantenimiento	Parcial		Preventivo programado, sin cobertura total

Fase IPv6 (Res. 2710/2017 y 1126/2021)	Sí	No	Observación
Diagnóstico	X		Fase 1 elaborada en 2026; plazo legal vencido el 31/12/2022
Implementación		X	Requiere prefijo del ISP, firewall compatible y reemplazo del AP D-Link DIR-619L
Pruebas de funcionalidad		X	Piloto doble pila con HAS, portal web (registro AAAA) y correo

6.6 Uso y apropiación de TI

Hay talleres y alfabetización digital en curso, pero sin estrategia formal, gestión del cambio ni medición de adopción (MGGTI 31,3 %, 2,5/8); el FURAG 2025 califica Cultura y apropiación con 100 por evidencias de actividades, no de resultados.

Grupo de interés	Rol	Necesidad principal
Equipo TIC	Agente de cambio	MRAE, TOGAF, ciberseguridad, nube, gestión de proyectos
Directivos y líderes de proceso	Patrocinador	Gobierno digital y datos para decidir

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

Funcionarios administrativos y contratistas	Impactado	Ofimática, sistemas institucionales, seguridad básica
Atención al ciudadano (ventanilla, PQRSD)	Multiplicador	SUIT, gestión documental, atención multicanal
Adultos mayores y mujeres rurales	Impactado	Uso del celular y servicios digitales del Estado
Jóvenes y estudiantes	Multiplicador	Ciudadanía digital y seguridad en línea
Emprendedores y productores agropecuarios	Impactado	Comercio electrónico, facturación electrónica

En 2026 la entidad elaboró la Estrategia de Uso y Apropiación (MAE-10) y el Plan de Comunicaciones de Proyectos TI (MAE-07); su ejecución inicia con este PETI. No hay incentivos para la adopción de TIC.

6.7 Seguridad y privacidad de la información

La seguridad avanzó más que cualquier otro dominio en 2026 en lo documental, pero los controles técnicos siguen ausentes: MSPI 1,65/5 frente a 97,46 en el FURAG 2025.

Eje MSPI	Criterios	Calificación (0–5)	Nivel	Prioridad
Gobernanza y liderazgo	3	2,33	Definido	Alta
Gestión de incidentes y continuidad	3	2,33	Definido	Alta
Protección de activos	4	1,75	Inicial	Crítica
Concienciación y mejora continua	2	1,50	Inicial	Alta
Gestión de riesgos	3	1,33	Inicial	Crítica
Cumplimiento – datos personales	3	0,67	Inicial	Crítica
Global	18	1,65	Inicial	Plan de mejora urgente

Avances 2026: Política de Seguridad (GA-F-002) y PSPI aprobados; RSI y Delegado de Protección de Datos designados (Res. 001/2026); matriz de riesgos, plan de tratamiento, procedimientos de incidentes (GA-PRC-002) y de vulnerabilidades y parches (GA-PRC-001); informe de vulnerabilidades.

Pendientes críticos: el informe de vulnerabilidades encontró 20 hallazgos (5 críticos, 8 altos, 7 medios y bajos) con remediación estimada desde $22 millones. Los críticos son falta de firewall perimetral, ausencia de respaldos 3-2-1, programa de datos personales sin registro ante la SIC, inventario de activos incompleto y gestión de parches sin centralizar.

La evaluación por dominios del Anexo A de ISO/IEC 27001 con la herramienta MSPI de MinTIC se hará en 2027 como línea base del SGSI.

Si se ejecuta el Plan de Tratamiento de Riesgos 2026, el riesgo residual pasa de 6 críticos y 8 altos a 0 críticos, 4 altos, 9 medios y 2 bajos.

6.8 Tendencias tecnológicas

Para un municipio de categoría 6, las tendencias con retorno inmediato son nube, ciberseguridad y analítica; IoT e IA se abordan como pilotos acotados.

Tendencia	Aplicación en El Rosal	Prioridad
Computación en la nube	Migrar HAS y archivos a IaaS o SaaS vía Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente; ofimática y correo en suite colaborativa	Alta
Plataformas de ciberseguridad	Firewall de nueva generación, antivirus con consola central y doble factor en correo	Alta
Analítica de datos	Tablero del Despacho conectado a Hacienda, Obras y metas del PDM	Alta
Interoperabilidad por APIs	Conexión con Servicios Ciudadanos Digitales y plataformas nacionales	Media
Inteligencia artificial	Asistente de atención en web y clasificación de PQRSD	Media
Internet de las cosas	Sensores de calidad de aire y agua; videovigilancia de las 34 JAC	Media
Blockchain y DevOps	Sin caso de uso con retorno en el periodo	Baja

6.9 DOFA de TI

Fortalezas	Debilidades
Liderazgo del Alcalde y documentos 2026 aprobados: PETI, PSPI, Política C&TI, RSI	Equipo de TI de tres personas con roles concentrados y contratistas anuales
FURAG 2025 en 78,04 con alza de 15,7 puntos desde 2022	Habilitador de Arquitectura en 21,67 y Servicios y Procesos Inteligentes en 12,5
Videovigilancia comunitaria avanzando en 34 JAC	Sin firewall, sin respaldos 3-2-1; 61 equipos con sistemas operativos sin soporte
Diagnósticos completos MSPI, MAE, MGGTI, MGPTI, C&TI e IPv6	Sin sistemas misionales, sin interoperabilidad ni gestión documental electrónica
Presencia activa en web y redes sociales	Sin rubro de TI ni metodología de proyectos

Oportunidades	Amenazas
Convocatorias MinTIC, Gobernación y regalías para conectividad y C&TI	Ransomware y phishing contra entidades territoriales
Acuerdos Marco de Precios para nube y licenciamiento	Sanciones de SIC, Procuraduría o MinTIC por datos personales e IPv6
Software público y Servicios Ciudadanos Digitales sin costo	Cambio de administración en 2028 y pérdida de continuidad
Cercanía a Bogotá y universidades para alianzas	Restricción presupuestal de municipio categoría 6

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

Demanda ciudadana de trámites en línea	Obsolescencia acelerada y dependencia de proveedores

7. SITUACIÓN DESEADA

A diciembre de 2027 la Alcaldía tendrá una gestión de TI en nivel Definido: MGGTI ≥ 79 %, MSPI ≥ 3,0/5, cero riesgos críticos, cinco trámites totalmente en línea y el habilitador de Arquitectura del FURAG en ≥ 60.

7.1 Estrategia de TI

Misión de TI: Proveer servicios tecnológicos seguros, disponibles y centrados en el ciudadano que habiliten la gestión de las dependencias, la toma de decisiones con datos y la transformación digital del territorio de El Rosal.

Visión de TI: En 2030 la gestión de TI de la Alcaldía de El Rosal será referente en Sabana Occidente por operar con arquitectura empresarial, servicios ciudadanos totalmente digitales, infraestructura segura en la nube y un equipo de TI formalizado que sostiene el Territorio Inteligente.

Objetivos estratégicos de TI:

ID	Objetivo	Dominios	Alineación	Meta 2026	Meta 2027
OETI-01	TI gobernada: formalizar gobierno, procesos, arquitectura y proyectos de TI	Estrategia, Gobierno	C&TI OE1; MIPG; FURAG Arquitectura	MGGTI ≥ 59 %; MAE ≥ 48 %	MGGTI ≥ 79 %; MAE ≥ 69 %; FURAG Arquitectura ≥ 60
OETI-02	Infraestructura segura y conectada	Infraestructura, Seguridad	C&TI OE2; PSPI y PTR	MSPI ≥ 2,5; 0 riesgos críticos residuales	MSPI ≥ 3,0; IPv6 doble pila; 100 % equipos con sistema soportado
OETI-03	Información para decidir	Información	C&TI OE1; Ley 1712; Decreto 1389	≥ 10 conjuntos de datos abiertos; inventario de datos al 100 %	≥ 25 conjuntos; tablero de gestión en ≥ 3 áreas; ≥ 3 sistemas interoperando
OETI-04	Servicios digitales para la ciudadanía	Sistemas de información	C&TI OE1 y OE6; Ley 2052; PDM	SUIT 100 %; ≥ 3 trámites en línea	≥ 5 trámites en línea; FURAG Servicios y Procesos Inteligentes ≥ 50
OETI-05	Personas y territorio digital	Uso y apropiación	C&TI OE2 y OE6; ODS 10	80 % funcionarios y	95 % funcionarios y

				200 ciudadanos formados; ≥ 5 zonas WiFi	500 ciudadanos; ≥ 10 zonas WiFi

Capacidades de TI a fortalecer o desarrollar:

Categoría	Capacidad	Acción
Estrategia	Gestionar arquitectura empresarial	Desarrollar (AS-IS 2026, TO-BE 2027)
Estrategia	Gestionar proyectos de TI	Desarrollar (metodología MGPTI)
Estrategia	Gestionar catálogo de servicios y ANS	Desarrollar
Gobierno	Gestionar procesos de TI	Desarrollar (macroproceso en MIPG)
Gobierno	Gestionar riesgos de TI	Fortalecer
Gobierno	Gestionar proveedores de TI	Desarrollar
Información	Gobernar datos y metadatos	Desarrollar
Información	Publicar datos abiertos	Fortalecer
Información	Analizar datos	Desarrollar
Sistemas de información	Administrar portafolio y ciclo de vida	Desarrollar
Sistemas de información	Interoperar	Desarrollar
Infraestructura	Gestionar disponibilidad, capacidad y monitoreo	Desarrollar
Infraestructura	Gestionar mesa de servicio	Fortalecer
Infraestructura	Gestionar nube	Desarrollar
Uso y apropiación	Gestionar el cambio y medir adopción	Desarrollar
Seguridad	Operar el SGSI y controles técnicos	Fortalecer

Servicios de TI objetivo: el catálogo pasa de 10 servicios informales a 14 servicios con ANS.

Servicio	Acción
Mesa de servicio	Crear con herramienta de tickets libre (por ejemplo GLPI); ANS de 4 h crítico y 2 días hábiles estándar
Acceso a internet y WiFi	Modificar: WiFi gestionado con red de invitados separada
Correo y colaboración	Modificar: doble factor, SPF, DKIM y DMARC; suite con almacenamiento en nube
Gestión de equipos	Modificar: plan anual de renovación y licenciamiento
Respaldo y restauración	Modificar: esquema 3-2-1 con pruebas semestrales
Seguridad perimetral	Crear: firewall de nueva generación y VLAN
Gestión de parches	Crear: WSUS o equivalente, cobertura ≥ 80 %
Alojamiento en nube	Crear: IaaS para sistemas institucionales
Gestión de proyectos de TI	Crear
Datos abiertos y analítica	Crear: portal de datos y tablero de gestión
Gestión de identidades	Crear: altas, bajas y revisión semestral de cuentas
Portal web, videovigilancia, capacitación	Mantener y medir

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

7.2 Gobierno de TI

El gobierno de TI operará como una sola instancia y un macroproceso de TI en el mapa MIPG, para no sumar comités que el equipo no puede sostener.

Instancia de decisión: el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sesionará trimestralmente como Comité de Gobierno Digital, Seguridad y C&TI, absorbiendo el Comité Municipal C&TI y el de Seguridad. Miembros: Alcalde, Secretaria General y de Gobierno, líder de TI, Secretarios de Planeación y Hacienda, y Control Interno con voz. Cada sesión revisa el tablero del PETI, los riesgos y las decisiones de inversión, con acta publicada.

Riesgos de TI: la matriz GA-MR-001 se amplía a riesgos de proyectos, obsolescencia y continuidad, con revisión semestral en el Comité.

Políticas de TI a adoptar en 2026–2027:

Política	Acción
Seguridad y privacidad	Mantener y socializar al 100 % del personal
Tratamiento de datos personales	Actualizar y registrar bases ante la SIC
Continuidad de servicios de TI	Crear con RTO y RPO para 5 servicios críticos
Gobierno y gestión de datos	Crear: responsables por dominio, calidad, apertura
Adquisición tecnológica	Crear: criterios de interoperabilidad, seguridad, IPv6, nube y software público antes de comprar
Nube	Crear: nube primero para sistemas nuevos
Desarrollo e implantación de sistemas	Crear: ciclo de vida, pruebas y aceptación

Macroproceso Gestión de TIC (estratégico):

Subproceso	Incluye
Planeación y arquitectura de TI	PETI, arquitectura empresarial, presupuesto, portafolio
Gestión de proyectos de TI	Inicio, seguimiento, cierre y lecciones aprendidas
Gestión de sistemas de información	Requerimientos, adquisición, pruebas, cambios
Gestión de información y datos	Gobierno de datos, datos abiertos, analítica
Gestión de servicios e infraestructura	Mesa de servicio, incidentes, cambios, capacidad, respaldos
Seguridad y privacidad	SGSI, riesgos, vulnerabilidades, incidentes
Uso y apropiación	Formación, comunicación y medición de adopción

Estructura y talento humano: separar la Oficina de TIC de Prensa con reporte directo al Despacho (Decreto 415 de 2016) y llevarla de 3 a 5 personas en 2027.

Rol	Cantidad	Funciones	Acción
Líder de TIC	1	Estrategia, arquitectura, gobierno, PETI	Formalizar cargo de planta en oficina TIC
Profesional de seguridad de la información	1	SGSI, riesgos, vulnerabilidades, datos personales	Crear (contrato 2026, planta 2027) para liberar al líder del rol RSI

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

Profesional de sistemas y datos	1	Portafolio de sistemas, datos abiertos, analítica	Mantener (contratista actual)
Técnico de infraestructura y redes	1	Red, servidores, nube, IPv6, respaldos	Mantener (contratista actual)
Técnico de mesa de servicio	1	Soporte nivel 1, inventario, mantenimiento	Crear en 2027

La matriz RACI de los procesos de TI se construye en 2026 sobre la RACI C&TI existente.

Gestión de proyectos: se adopta una metodología PMI simplificada alineada al MGPTI: ficha y acta de inicio, cronograma, informe mensual de avance al Comité, control de cambios, acta de cierre y lecciones aprendidas.

Presupuesto: crear un rubro de inversión de TI en el presupuesto 2027, con línea base de costo por proyecto y seguimiento mensual en el tablero del PETI.

7.3 Gestión de información

La información se gestionará como activo con cuatro iniciativas: gobierno de datos, ecosistema de analítica, interoperabilidad y capacidades de uso.

Componente	Estado objetivo 2027
Gobierno de datos	Política aprobada; un responsable de datos por secretaría; catálogo de activos y datos maestros (contribuyente, predio, beneficiario, contrato)
Arquitectura de información	Modelo de información AS-IS 2026 y TO-BE 2027 en el repositorio de AE
Servicios de intercambio	Conexión con la plataforma de interoperabilidad del Estado (Servicios Ciudadanos Digitales) y con SUIT, SECOP y CHIP para evitar doble digitación
Calidad y seguridad	Reglas de calidad para datos maestros; clasificación pública, clasificada o reservada en todos los activos
Análisis y aprovechamiento	Tablero de gestión del Despacho alimentado automáticamente; tableros de Hacienda y Obras
Datos abiertos	Plan actualizado; ≥ 10 conjuntos en 2026 y ≥ 25 en 2027 en datos.gov.co
Capacidades	Formación en analítica básica para un enlace por secretaría

7.4 Sistemas de información

El portafolio objetivo prioriza reutilizar software público y servicios en la nube antes de comprar, y que cada sistema tenga ficha técnica, responsable y ANS.

Sistema	Acción	Plazo
HAS financiero	Migrar a servidor soportado o nube y evaluar solución integrada financiera-tributaria	2026 migración, 2027 evaluación
Módulo tributario	Habilitar liquidación y pago en línea de predial e ICA con botón de pagos	2027

Gestión documental electrónica	Implementar sistema con TRD, ventanilla única de radicación y PQRSD	2026–2027
Portal web	Accesibilidad WCAG 2.1, IPv6, sección de trámites en línea y datos abiertos	2026
Portal único de servicios y app ciudadana	Ventanilla digital integrada a GOV.CO y autenticación digital	2027
Tablero de gestión	Herramienta de inteligencia de negocios de uso libre o en suite colaborativa	2027
Plataformas nacionales	Mantener; reducir cargue manual vía interoperabilidad	Continuo

Actividad	Madurez objetivo	Acción de mejora
Levantamiento y análisis de requisitos	Implementado	Formato único de requerimientos y aprobación del Comité
Diseño de la solución	Implementado	Revisión de arquitectura antes de contratar
Pruebas y aceptación	Implementado	Lista de verificación de calidad y seguridad
Despliegue y cambios	Implementado	Control de cambios con plan de reversión
Mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo	Implementado	ANS en contratos y hoja de ruta anual por sistema
Soporte niveles 1 a 3	Implementado	Mesa de servicio con tickets y escalamiento a proveedores

7.5 Infraestructura de TI

La infraestructura objetivo es segura por diseño, en doble pila IPv6 y con servicios críticos en la nube o en servidores soportados y monitoreados.

Servicio	Estado objetivo	Plazo
ST.SI.01 Nube	Estrategia de nube aprobada; sistema financiero y respaldos en IaaS vía Acuerdo Marco	2027
ST.SI.02 Redes	Diagrama de red; VLAN por dependencia y servicio; WiFi gestionado; conectividad 100 % en sedes	2026
ST.SI.03 Seguridad perimetral	Firewall de nueva generación con IPS, filtrado web y VPN	2026
ST.SI.04 Servidores	Retiro de Windows Server 2012; virtualización de servidores restantes	2026–2027
ST.SI.05 Almacenamiento y respaldo	Esquema 3-2-1: disco local, NAS y copia en nube; pruebas semestrales	2026
ST.SI.07 Centro de cómputo	Registro de acceso, UPS dimensionada y control ambiental básico	2026
ST.SI.08 Equipos de usuario	Renovación de 9 equipos sin soporte y migración de 52 a Windows 11 o reemplazo; licenciamiento legal al 100 %	2026–2027
Monitoreo y capacidad	Herramienta libre de monitoreo (por ejemplo Zabbix) con alertas	2026
IPv6	Fase 2 implementación en doble pila y Fase 3 pruebas	2027

Gestión de ANS	ANS internos publicados y en todos los contratos de TI	2027

7.6 Uso y apropiación de TI

Cada proyecto del portafolio tendrá plan de gestión del cambio y la adopción se medirá por sistema.

- Plan anual de formación en competencias digitales: 80 % de funcionarios en 2026 y 95 % en 2027.
- Alfabetización digital ciudadana con prioridad rural, adultos mayores y mujeres: 200 personas en 2026 y 500 en 2027.
- Incentivos: reconocimiento trimestral a la dependencia con mayor adopción y certificados de formación.
- Medición: uso de cada sistema, satisfacción con servicios de TI y encuesta anual de percepción ciudadana.
- Comunicación: 24 piezas en 2026 y 36 en 2027 sobre servicios digitales.

7.7 Seguridad y privacidad

El SGSI llegará a nivel Definido en 2027 con los controles técnicos del Plan de Tratamiento implementados y medidos.

Componente	Meta
Calificación MSPI	2,5 en 2026 y 3,0 en 2027
Riesgos residuales críticos	0 en 2026
Vulnerabilidades críticas y altas	100 % remediadas en 2026
Datos personales	Bases registradas ante la SIC y procedimiento de derechos de titulares en 2026
Continuidad	RTO y RPO para 5 servicios críticos y una prueba anual
Concienciación	Simulacro de phishing semestral y 80 % del personal capacitado
Auditoría	Auditoría interna anual del SGSI por Control Interno

8. Catálogo de brechas

Las 62 brechas de los diagnósticos 2026 (12 MAE, 10 MGGTI, 10 MGPTI, 10 MSPI y 20 vulnerabilidades) se consolidan en 20 brechas de PETI; 6 son críticas porque exponen a sanción o a pérdida de información y deben cerrarse antes de junio de 2027.

ID	Dominio	Elemento	Acción	Brecha y justificación	Origen	Prioridad	Proyecto
B01	Seguridad	Firewall y segmentación	Crear	Red sin firewall perimetral ni VLAN; riesgo R-04 de ransomware (20/25)	MSPI B-04; vulnerabilidad crítica	Crítica	PT-04

B02	Seguridad	Respaldo y continuidad	Modificar	Backups solo en servidores, sin pruebas ni 3-2-1; sin RTO/RPO	MSPI B-07; R-07, R-14	Crítica	PT-05
B03	Seguridad	Programa de datos personales	Crear	Bases sin registro ante SIC ni procedimiento de derechos de titulares	MSPI B-02, B-05; R-02, R-08	Crítica	PT-10
B04	Infraestructura	Servidor del sistema financiero	Eliminar	Windows Server 2012 sin soporte aloja HAS	IPv6 Fase 1; ASI-05	Crítica	PT-08
B05	Infraestructura	Equipos de usuario	Modificar	61 equipos con sistema operativo sin soporte; 18 registros sin licencia; 38 con ≤ 4 GB	Inventario GA-F-033	Crítica	PT-07
B06	Infraestructura	Parches y antivirus	Crear	Actualizaciones manuales sin consola central	MSPI; R-05; AT-03	Alta	PT-06
B07	Infraestructura	Protocolo IPv6	Crear	Solo diagnóstico; plazo legal vencido en 2022	IPv6 Fase 1; AT-06	Crítica	PT-09
B08	Gobierno	Macroproceso y esquema de gobierno de TI	Crear	TI sin proceso en MIPG ni reglas de decisión	B-MGGTI-01, 02	Alta	PT-01
B09	Gobierno	Estructura de TI	Modificar	TI dentro de Prensa, 3 personas, roles concentrados (Decreto 415 de 2016)	GTI-02; MGGTI	Alta	PT-01
B10	Estrategia	Arquitectura empresarial	Crear	Sin adopción MRAE, repositorio ni AS-IS; FURAG Arquitectura 21,67	B-MAE-01 a 04	Alta	PT-02
B11	Estrategia	Gestión de proyectos de TI	Crear	Sin metodología, actas, informes ni lecciones aprendidas	B-MGPTI-01 a 10	Alta	PT-03
B12	Estrategia	Catálogo de servicios y mesa de servicio	Crear	Sin catálogo, ANS ni tickets	B-MGGTI-04, 08	Alta	PT-17

B13	Información	Gobierno de datos e inventario	Crear	Sin responsables, inventario completo ni metadatos	B-MAE-05, 06; B-MGGTI-03, 07	Alta	PT-11
B14	Información	Datos abiertos	Modificar	Plan desactualizado, sin conjuntos publicados recientes	AInfo-04; C&TI	Media	PT-11
B15	Información	Analítica	Crear	Reportes manuales; consolidado del Despacho copiado a mano	C&TI; ETI-07	Media	PT-12
B16	Sistemas	Gestión documental electrónica	Crear	Sin sistema, TRD digital ni ventanilla única	ASI; Plan de acción C&TI	Alta	PT-13
B17	Sistemas	Trámites en línea	Modificar	SUIT ~60 %; ningún trámite 100 % en línea; FURAG Servicios y Procesos Inteligentes 12,5	ASI-06; C&TI	Alta	PT-14, PT-15
B18	Sistemas	Interoperabilidad	Crear	Sistemas aislados; cero intercambio con plataformas nacionales	AInfo-06; ASI-04	Media	PT-16
B19	Uso y apropiación	Formación y gestión del cambio	Modificar	Sin plan formal ni medición de adopción	B-MGGTI-09, 10	Media	PT-18
B20	Infraestructura	Conectividad territorial	Modificar	Conectividad institucional parcial y WiFi rural incompleto	C&TI	Media	PT-19

El detalle de las 62 brechas de origen está en los informes MAE-01, MAE-02, MAE-03 y en el Diagnóstico MSPI (anexos).

9. Portafolio de proyectos y hoja de ruta

El portafolio tiene 21 proyectos por $228–389 millones entre octubre de 2026 y diciembre de 2027: $180–304 millones de TI institucional (la mitad es renovación de equipos) y $48–85 millones de proyectos sectoriales C&TI liderados por otras secretarías.

9.1 Iniciativas de otros planes de la Política de Gobierno Digital

Plan	Iniciativas que incorpora el PETI	Proyecto

Plan de Seguridad y Privacidad (PSPI 2026)	Autodiagnóstico de madurez, capacitación, auditoría interna	PT-10
Plan de Tratamiento de Riesgos 2026	Firewall, 3-2-1, parches, inventario de activos, continuidad	PT-04, PT-05, PT-06, PT-11
Plan de Datos Abiertos	Actualización y publicación de conjuntos	PT-11
Plan de adopción IPv6	Fases 2 y 3	PT-09
Plan de racionalización de trámites	SUIT al 100 % y trámites en línea	PT-14
Hoja de ruta de Arquitectura Empresarial	AS-IS, TO-BE, repositorio	PT-02
Plan de acción C&TI 2026–2027	Conectividad, videovigilancia, pilotos sectoriales	PT-19, PT-20, PT-21
Estrategia de Uso y Apropiación	Formación y alfabetización digital	PT-18

9.2 Portafolio priorizado

La priorización usa la plantilla de evaluación de proyectos del MRAE: impacto en capacidades (40 %), capacidad de ejecución (35 %) y ganancias rápidas (25 %), en escala de 0 a 5. Costos en millones de pesos, estimados a validar con cotizaciones o Acuerdos Marco.

ID	Proyecto y alcance	OETI	Brechas	Líder	Costo (M COP)	Fuente	Plazo	Puntaje
PT-01	Gobierno de TI: comité único, macroproceso TIC en MIPG, RACI de TI, políticas, propuesta de oficina TIC	01	B08, B09	Líder TIC y Sec. General	0	Propios	Oct 2026 – Mar 2027	4,75
PT-17	Mesa de servicio con tickets y catálogo de 14 servicios con ANS	01	B12	Contratista TIC	1–2	Propios	Nov 2026 – Feb 2027	4,60
PT-05	Respaldos 3-2-1 y plan de continuidad con RTO/RPO	02	B02	Contratista infraestructura	4–8	Presupuesto TIC	Oct 2026 – Mar 2027	4,40
PT-10	SGSI y datos personales: registro SIC, derechos de titulares, autodiagnóstico, phishing, auditoría	02	B03	RSI y Jurídica	6–10	Presupuesto TIC	Oct 2026 – Dic 2027	4,40
PT-03	Gestión de proyectos de TI: metodología MGPTI, plantillas, herramienta, informes mensuales	01	B11	Líder TIC	1–2	Propios	Nov 2026 – Mar 2027	4,35
PT-18	Formación de funcionarios y alfabetización ciudadana con gestión del cambio	05	B19	Líder TIC y Talento Humano	8–13	TIC, SGP	Oct 2026 – Dic 2027	4,35
PT-06	Parches centralizados, antivirus con consola y monitoreo de infraestructura	02	B06	Contratista infraestructura	2–4	Presupuesto TIC	Nov 2026 – Abr 2027	4,15


Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

PT-11	Gobierno de datos: política, responsables, inventario y clasificación, datos abiertos (≥ 25)	03	B13, B14	Contratista sistemas y datos	3–5	Presupuesto TIC	Nov 2026 – Dic 2027	4,10
PT-20	Videovigilancia en 34 JAC y centro de monitoreo	05	—	Sec. Gobierno	10–20	Gobierno, SGP	En curso – Jun 2027	4,05
PT-12	Tablero de gestión del Despacho y analítica en ≥ 3 áreas	03	B15	Contratista sistemas y datos	5–10	TIC, MinTIC	Feb – Oct 2027	4,00
PT-14	Trámites: SUIT 100 %, 5 trámites en línea, pago de predial e ICA, web accesible	04	B17	Líder TIC y dependencias	5–8	Presupuesto TIC	Oct 2026 – Dic 2027	4,00
PT-19	Conectividad 100 % en sedes y ≥ 10 zonas WiFi comunitarias	05	B20	Contratista infraestructura y Sec. Gobierno	18–30	SGP, MinTIC	Nov 2026 – Dic 2027	3,80
PT-02	Arquitectura empresarial: adopción MRAE, repositorio, AS-IS y TO-BE en 5 dominios	01	B10	Líder TIC	8–15	TIC, MinTIC	Oct 2026 – Dic 2027	3,75
PT-04	Firewall de nueva generación, VLAN y WiFi institucional gestionado	02	B01	Contratista infraestructura	10–20	Inversión TIC	Dic 2026 – Jun 2027	3,55
PT-08	Retiro de Windows Server 2012, migración de HAS y estrategia de nube	02	B04	Líder TIC	5–10	Inversión TIC	Ene – Sep 2027	3,55
PT-07	Renovación de equipos sin soporte, ampliación de RAM y SSD, licenciamiento legal	02	B05	Líder TIC y Almacén	90–130	Inversión, Acuerdo Marco	Feb – Dic 2027	3,45
PT-13	Gestión documental electrónica, ventanilla única y PQRSD	04	B16	Sec. General y líder TIC	5–20	Inversión TIC	Mar – Dic 2027	3,20
PT-09	IPv6 doble pila: implementación y pruebas	02	B07	Contratista infraestructura	2–5	Presupuesto TIC	Abr – Nov 2027	3,15
PT-15	Portal único de servicios, app ciudadana y atención multicanal	04	B17	Líder TIC	17–27	MinTIC, propios	Abr – Dic 2027	2,90
PT-21	Pilotos C&TI: sensores ambientales, movilidad, telemedicina y LabCTI	05	—	Planeación, Salud, Comité C&TI	20–35	Cooperación, MinTIC	Mar – Dic 2027	2,65
PT-16	Interoperabilidad de ≥ 3 sistemas y conexión con Servicios Ciudadanos Digitales	03	B18	Contratista sistemas y datos	8–15	TIC, MinTIC	Jun – Dic 2027	2,55

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

La ficha de cada proyecto (alcance, entregables, riesgos, indicadores y supervisor) se elabora con el acta de inicio de PT-03 y se anexa al PETI.

9.3 Hoja de ruta

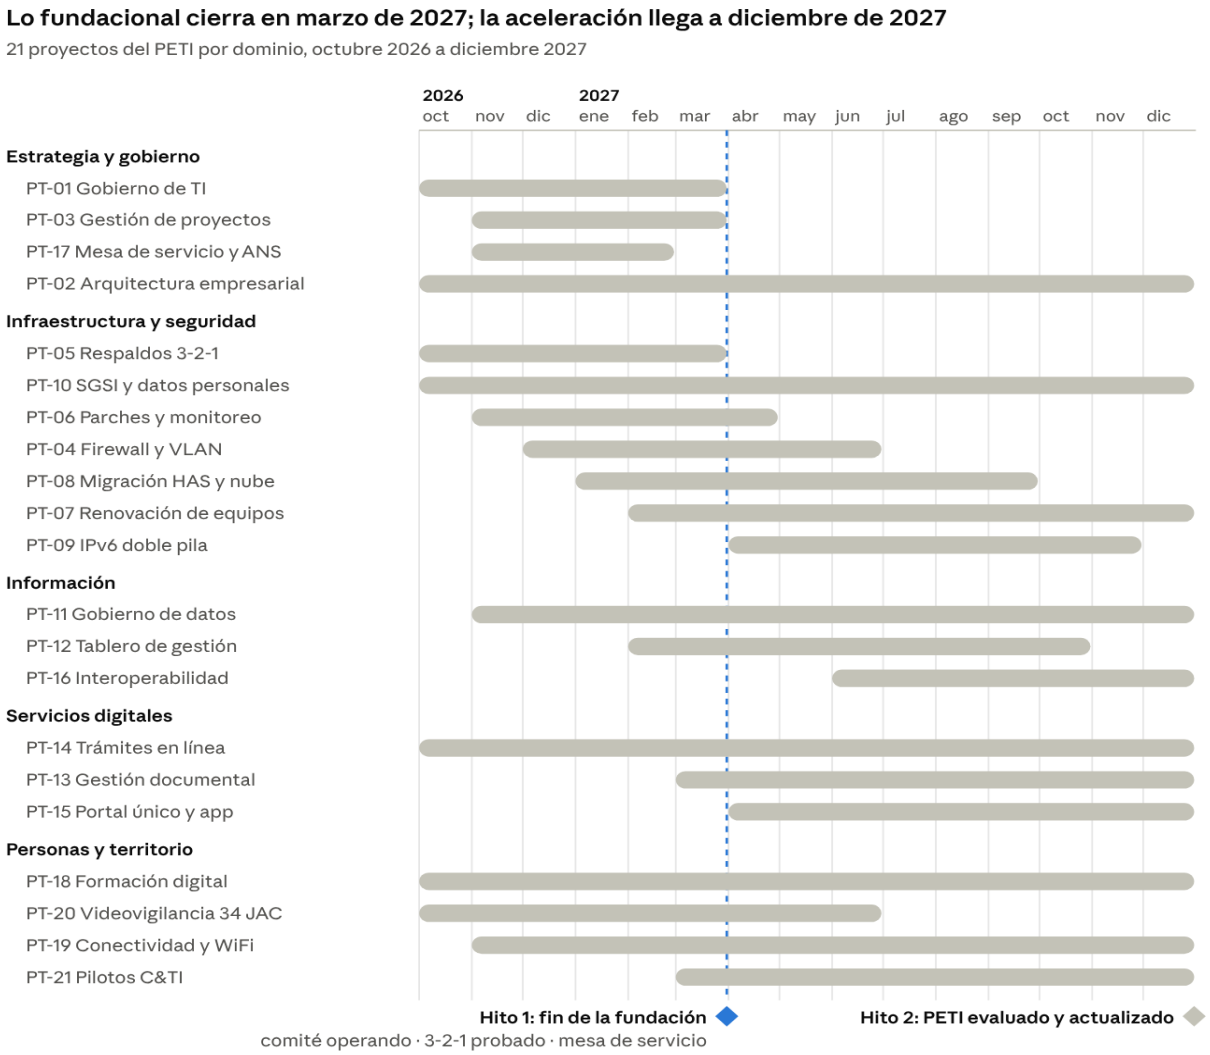

Hoja de ruta del PETI · 21 proyectos, octubre 2026 – diciembre 2027 · fechas de la tabla 9.2

La fase de fundación (octubre 2026 – marzo 2027) cierra gobierno, respaldos, mesa de servicio y metodología de proyectos; el Comité la verifica en el Hito 1 antes de liberar la inversión de la fase de aceleración. Para 2028–2030, sujeto al próximo Plan de Desarrollo, quedan como proyección la interoperabilidad avanzada, la inteligencia artificial en atención, la red de ≥ 20 sensores y el segundo ciclo de arquitectura empresarial.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

9.4 Dependencias y financiación

- PT-04 (firewall) es requisito de PT-09 (IPv6) y de PT-08 (migración a nube).
- PT-11 (inventario de datos) es requisito de PT-12 (tablero) y PT-16 (interoperabilidad).
- PT-13 (gestión documental) y PT-14 (trámites) alimentan PT-15 (portal único).
- PT-01 y PT-03 condicionan todos los demás: sin comité y sin ficha de proyecto no se aprueba ninguna inversión.
- Fuentes: presupuesto propio para lo fundacional; SGP y MinTIC para conectividad; Acuerdos Marco de Colombia Compra Eficiente para equipos, licencias y nube; regalías y cooperación para pilotos C&TI.
- Los proyectos 2028–2030 se incluirán en el empalme y en el próximo Plan de Desarrollo para dar continuidad.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

10. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

El tablero del PETI tiene 16 indicadores de estrategia (ES) y de gestión (GT); el líder de TIC los reporta cada trimestre al Comité y Control Interno los verifica cada semestre. Rangos: bueno ≥ 80 %, intermedio 60–79 %, malo < 60 %, salvo donde se indique.

ID	Indicador	Fórmula	Línea base 2026	Meta dic 2026	Meta dic 2027	Frecuencia
ES-01	Ejecución del PETI	(Actividades ejecutadas / programadas) × 100	0 %	≥ 85 % del plan Q4	≥ 85 %	Trimestral
ES-02	Proyectos a tiempo y en presupuesto	(Proyectos en tiempo y costo / total) × 100	Sin medición	≥ 60 %	≥ 85 %	Trimestral
ES-03	Índice de Gobierno Digital FURAG	Resultado oficial	78,04 (2025)	≥ 80	≥ 85	Anual
ES-04	Habilitador Arquitectura FURAG	Resultado oficial	21,67 (2025)	≥ 40	≥ 60	Anual
ES-05	Madurez MGGTI	Puntaje / 76 × 100	39,5 %	≥ 59 %	≥ 79 %	Semestral
ES-06	Madurez MAE	Puntaje / 58 × 100	26,7 %	≥ 48 %	≥ 69 %	Semestral
ES-07	Presupuesto de TI ejecutado	(Ejecutado / asignado) × 100	Sin rubro	Rubro creado	≥ 80 %	Mensual
GT-01	Disponibilidad de servicios críticos	((Tiempo acordado − tiempo caído) / tiempo acordado) × 100	Sin medición	≥ 98 %	≥ 99 %	Mensual
GT-02	Incidentes resueltos dentro del ANS	(Resueltos en tiempo / reportados) × 100	Sin medición	≥ 70 %	≥ 90 %	Mensual
GT-03	Restauraciones de respaldo exitosas	(Exitosas / realizadas) × 100; bueno ≥ 98 %	0 pruebas	1 prueba exitosa	100 %	Semestral
GT-04	Equipos con sistema operativo	(Equipos conformes / total) × 100	≈ 22 de 84 (26 %)	≥ 40 %	100 %	Semestral

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

	soportado y licenciado					
GT-05	Madurez MSPI	Calificación 0–5	1,65	≥ 2,5	≥ 3,0	Anual
GT-06	Vulnerabilidades críticas y altas remediadas	(Remediadas / identificadas) × 100	0 de 13	≥ 50 %	100 %	Trimestral
GT-07	Trámites totalmente en línea	Número de trámites	0	3	5	Trimestral
GT-08	Conjuntos de datos abiertos publicados	Número en datos.gov.co	Sin conjuntos vigentes	10	25	Trimestral
GT-09	Funcionarios formados en competencias digitales	(Formados / total) × 100	Sin medición	≥ 80 %	≥ 95 %	Trimestral

Las metas de diciembre de 2026 que no se cumplan en el cuarto trimestre se trasladan al primer trimestre de 2027 con decisión del Comité. La hoja de vida de cada indicador (responsable, fuente de datos y rangos) se diligencia en la Actividad 14B del Anexo 1.

11. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PETI

El PETI se aprueba en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se publica en la web antes del 31 de enero de cada año con el plan de acción (Decreto 612 de 2018) y se socializa a cada grupo de interés con un mensaje propio.

11.1 Aprobación y publicación

1. Revisión técnica del borrador por el equipo TIC y Planeación.
2. Aval de la Secretaría General y de Gobierno.
3. Presentación y aprobación en el Comité, con acta.
4. Adopción mediante acto administrativo del alcalde.
5. Publicación en Transparencia > Planeación de elrosal-cundinamarca.gov.co, en formato accesible.
6. Actualización anual en el cuarto trimestre y cada vez que cambie el Plan de Desarrollo.

11.2 Plan de socialización

Actividad	Grupo de interés	Canal	Formato	Responsable	Frecuencia
Presentación ejecutiva del PETI y su tablero	Alcalde y secretarios	Comité	Presentación de 10 diapositivas	Líder TIC	Trimestral
Informe de avance de proyectos	Alcalde, Secretaría General	Correo institucional	Informe de 2 páginas	Líder TIC	Mensual
Taller de socialización	Funcionarios y contratistas	Presencial y virtual	Taller de 1 hora por dependencia	Equipo TIC	Al aprobar y anual
Pieza “qué cambia para usted”	Funcionarios	Correo, cartelera, WhatsApp institucional	Infografía	Prensa	Por cada proyecto
Publicación del PETI y avances	Ciudadanía	Portal web y redes sociales	Documento, resumen y video corto	Prensa	Anual y por hito
Rendición de cuentas de TI	Ciudadanía y JAC	Audiencia pública	Sección de transformación digital	Alcalde y Líder TIC	Anual
Reporte de cumplimiento	MinTIC y Gobernación	FURAG y formulario MMMCTIC	Formularios oficiales	Líder TIC y Control Interno	Anual
Requerimientos y ANS	Proveedores de TI	Reunión de supervisión	Acta	Supervisores de contrato	Mensual

El detalle por proyecto está en el Plan de Comunicaciones de Proyectos TI (MAE-07) 12. GLOSARIO, REFERENCIAS Y ANEXOS

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

12. GLOSARIO, REFERENCIAS Y ANEXOS

12.1 Glosario

Término	Definición
AE	Arquitectura Empresarial: práctica que alinea estrategia, procesos, información, sistemas y tecnología
ANS	Acuerdo de Nivel de Servicio: compromiso medible de tiempo o disponibilidad de un servicio
AS-IS / TO-BE	Estado actual y estado objetivo de la arquitectura
C&TI	Ciudades y Territorios Inteligentes
Doble pila	Operación simultánea de IPv4 e IPv6 en la red
FURAG	Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión de Función Pública
IaaS / SaaS	Infraestructura o software contratados como servicio en la nube
MAE / MGGTI / MGPTI	Modelos del MRAE: Arquitectura Empresarial, Gestión y Gobierno de TI, Gestión de Proyectos de TI
MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MMMCTIC	Modelo de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes de MinTIC
MRAE	Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado colombiano
MSPI / SGSI	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información / Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
PSPI / PTR	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información / Plan de Tratamiento de Riesgos
RSI	Responsable de Seguridad de la Información
RTO / RPO	Tiempo máximo de recuperación de un servicio / pérdida máxima tolerable de datos
SUIT	Sistema Único de Información de Trámites
3-2-1	Tres copias de los datos, en dos medios distintos, una fuera de la sede

12.2 Referencias

- *MinTIC. MGGTI.GE.ES.03 – Guía para la construcción del PETI, v3.0, noviembre 2023, y Anexos 1 y 2.*
- *MinTIC. G.ES.06 – Construcción del PETI: planeación de la tecnología para la transformación digital, julio 2019.*
- *MinTIC. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial MRAE v3.0 e Instrumento de evaluación de madurez, 2023.*
- *MinTIC. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información; Guía de transición de IPv4 a IPv6 para Colombia, 2021.*
- *Función Pública. Resultados FURAG – Índice de Gobierno Digital, Alcaldía de El Rosal, 2022–2025.*
- *Alcaldía de Facatativá. PETI 2024–2027. Alcaldía de Cota. PETI 2020–2023. Colombia Compra Eficiente. PETI 2026. Minciencias. PETI 2023–2026.*
- *Gobernación de Cundinamarca – Misión, visión y Plan de Desarrollo.*
- *MinVivienda – Inversiones en acueductos de El Rosal y La Mesa (2013).*
- *Alcaldía de El Rosal – Acuerdo 03 de 2024, Plan de Desarrollo Municipal.*

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

12.3 Anexos

Anexo	Documento	Código
A	Herramientas para la construcción del PETI diligenciadas (actividades 1 a 17)	Anexo 1 MinTIC
B	Diagnóstico de Seguridad y Privacidad MSPI 2026	GA-F-001
C	Política de Seguridad y Privacidad; PSPI; PESI	GA-F-002
D	Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento de Riesgos 2026	GA-MR-001
E	Informe de Vulnerabilidades; procedimientos de parches e incidentes	GA-PRC-001, GA-PRC-002
F	Resolución de designación RSI y Delegado de Datos	Res. 001/2026
G	Informes de brechas MAE, MGGTI y MGPTI	MAE-AE-001, MAE-MGGTI-001, MAE-03
H	Proceso de AE, repositorio, hoja de ruta AE, priorización de proyectos	MAE-04 a MAE-06, MAE-08
I	Plan de comunicaciones, lecciones aprendidas y estrategia de uso y apropiación	MAE-07, MAE-09, MAE-10
J	Diagnóstico, política, gobernanza, RACI, visión, hoja de ruta y plan de acción C&TI	CI-DX-001 a CI-PA-001
K	Diagnóstico IPv6 Fase 1	2026
L	Inventario de equipos de cómputo y móviles	GA-F-033
M	Catálogo de sistemas de información y fichas de proyecto	Por elaborar (PT-02, PT-03)
